

Iktatószám: **IKT-2017-614-11-00006226**Kedvezményezett neve: **Kapoly Község Önkormányzata**Projekt címe: **Óvoda fejlesztése Kapoly községben**Projekt azonosítószám: **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**

Postacím: **7401 Kaposvár, Pf. 115.**
 Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**
 Aláírásra jogosult képviselője: **Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető**
 Azonosító szám (törzs-szám): **237309**
 PIR törzsszám: **329970**
 Adószám: **15329970-2-41**

másrésről **Kapoly Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8671 Kapoly, Kossuth utca 56.**
 Székhely: **8671 Kapoly, Kossuth utca 56.**
 Azonosító szám (törzs-szám): **PIR törzsszám: 399959**
 Adószám: **15399959-1-14**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10403916-49555654-53511183**
 Aláírásra jogosult képviselője: **Vidus Lajos, polgármester**
dr. Mezőfi Ágnes, jegyző

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családdbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050** azonosító számon regisztrált, 2016.09.21. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

7 my @



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Óvoda fejlesztése Kapoly községben” című és **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8671 Kapoly, Petőfi u. 14. házszám, 237., 238. hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év 10. hó 16. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év 11. hónap 30. nap**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. év 02. hónap 28. nap**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **15.000.000,- Ft**, azaz tizenötmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **15.000.000,- Ft**, azaz tizenötmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **15.000.000,- Ft**, azaz tizenötmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **15.000.000,- Ft**, azaz tizenötmillió forint.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege konzorciumi tagonként:

Kapoly Község Önkormányzata	100 %	14.400.000,- Ft
Somogy Megyei Önkormányzat	100 %	600.000,- Ft
Összesen	100 %	15.000.000,- Ft

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes

Handwritten signatures and initials in blue ink.

adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


ly my @

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6 oldalon és 4 db eredeti példányban** készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kaposvár Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Kaposvár, 2017. év 10. hónap 20. napján.


Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Kaposvár, 2017. év 10. hónap 20. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

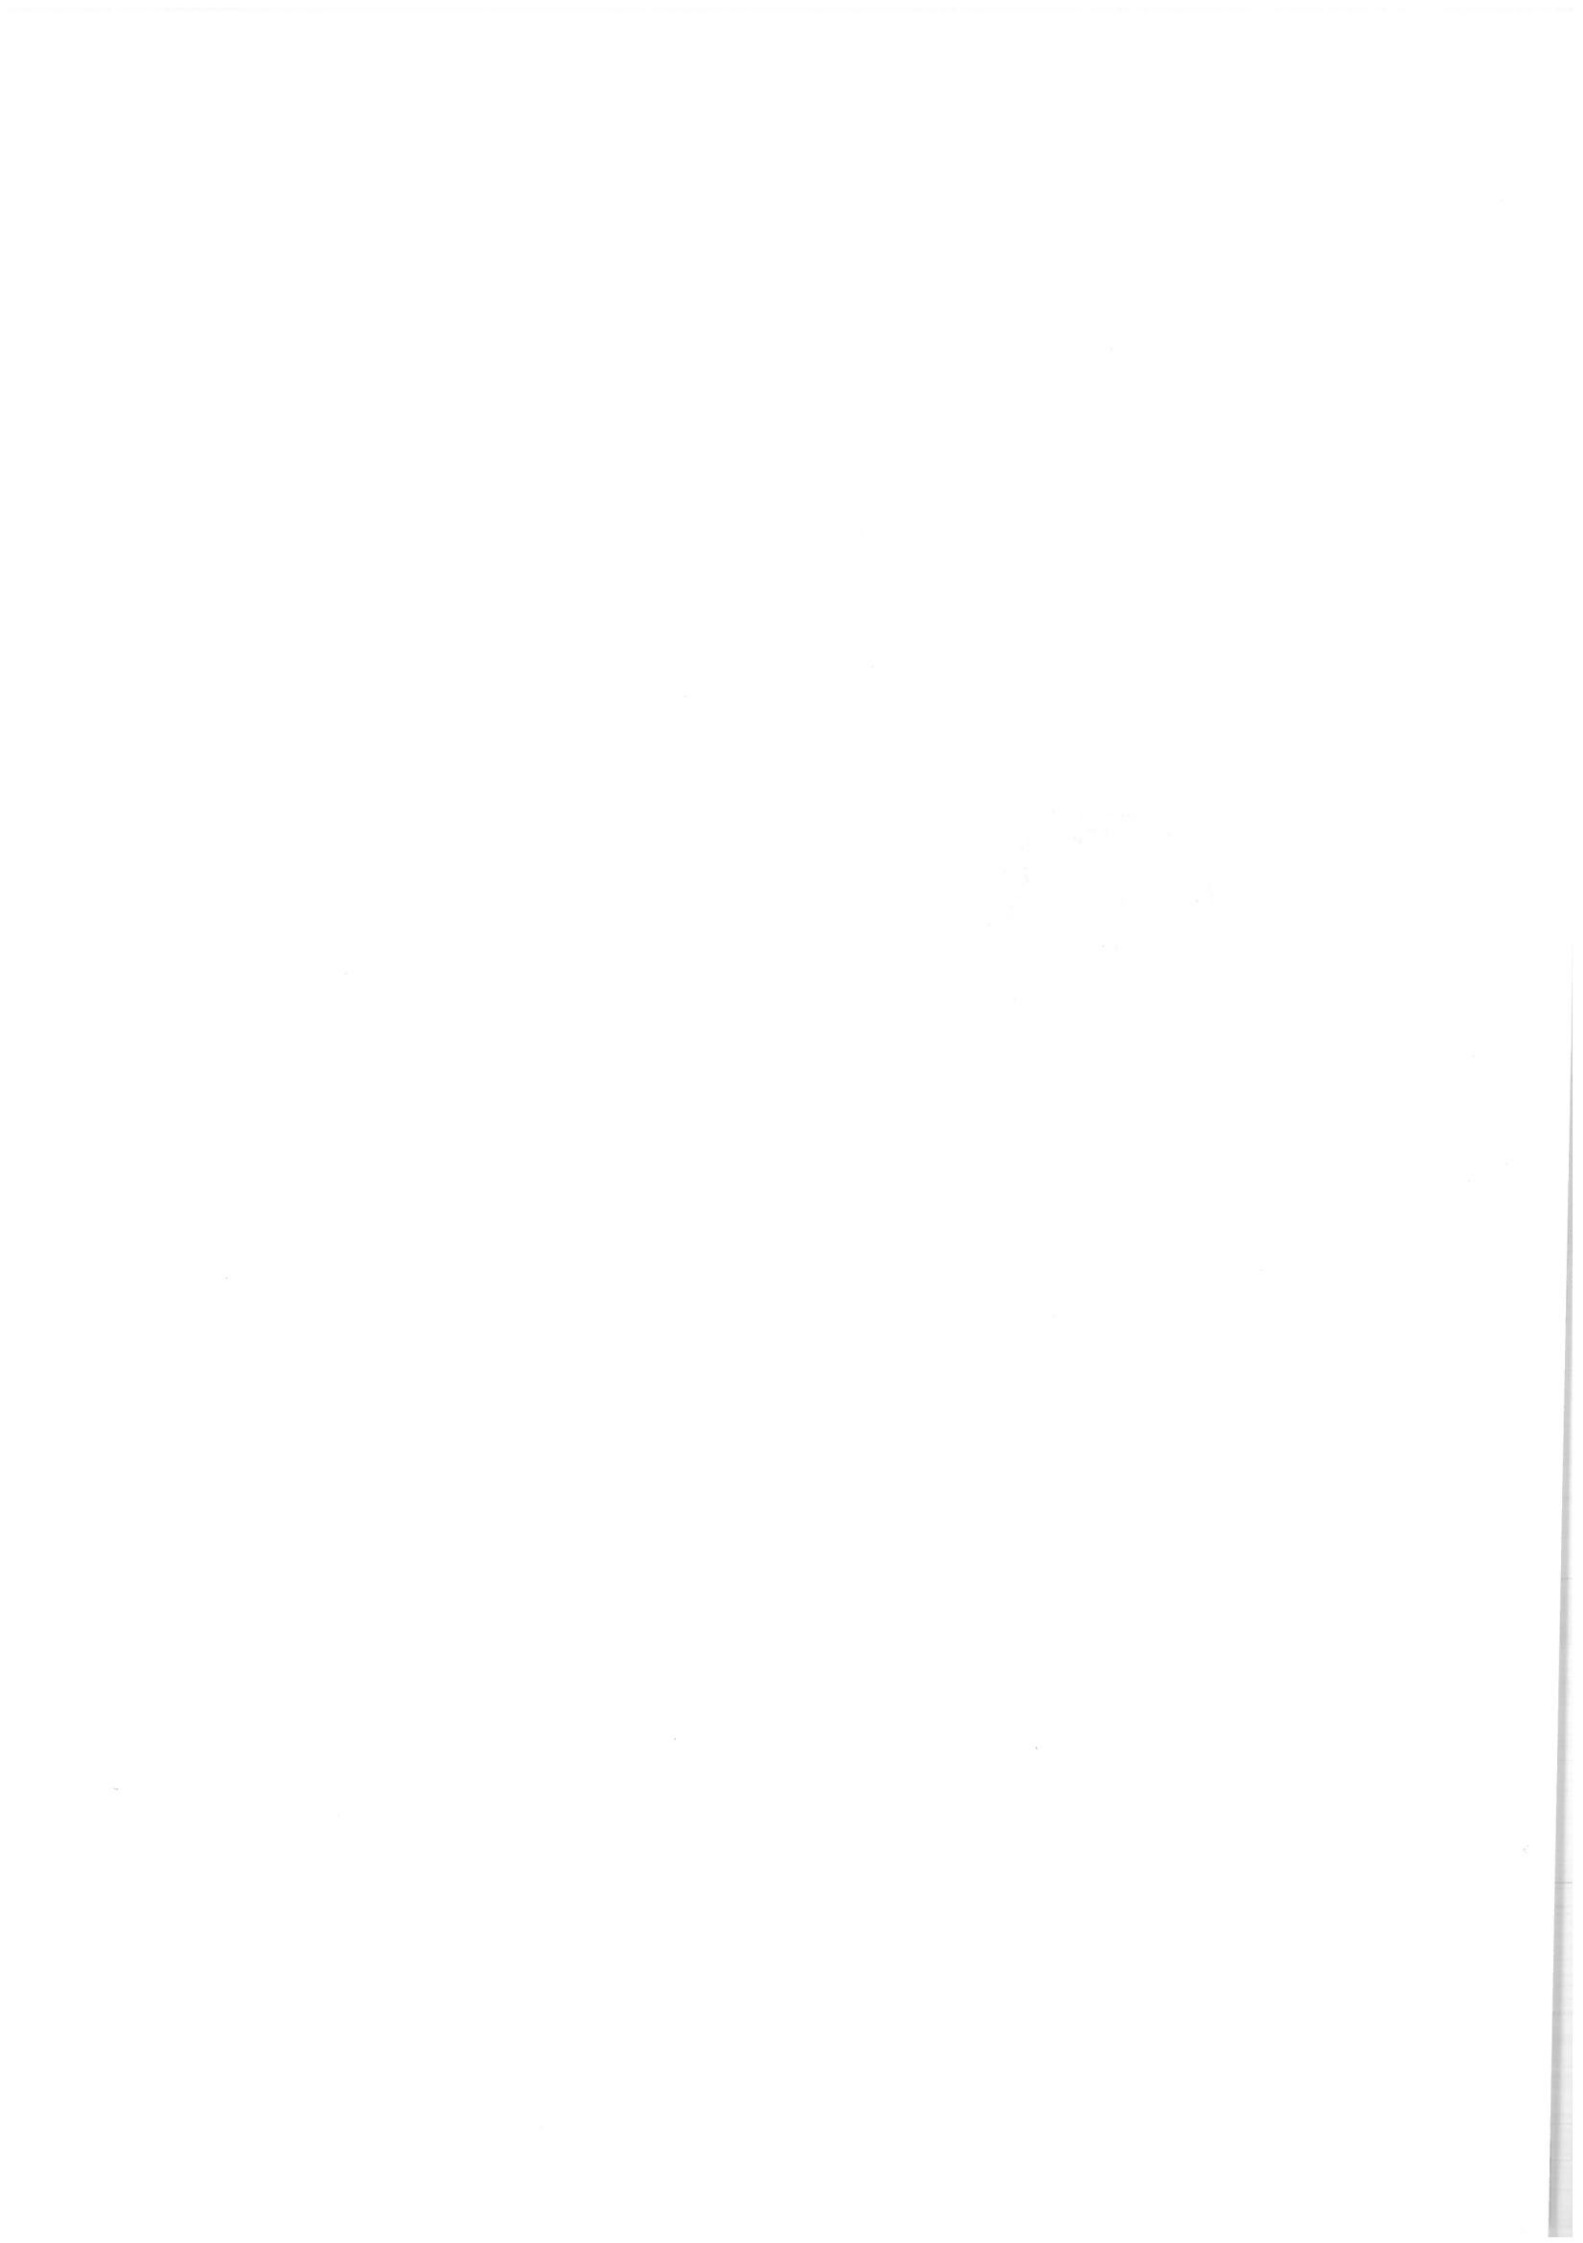

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	10 748 032	2 901 968	13 650 000
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	472 441	127 559	600 000
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés	1	118 110	31 890	150 000
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	295 276	0	295 276
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	79 724	0	79 724
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	59 055	15 945	75 000
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	118 110	31 890	150 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							15 000 000

Vass György
 Kapoly Község Önkormányzata
 Képviseletének vezetője



Kelt: Kapoly, 2017. év hónap napján.

P.H. Magyar Államkincstár
 Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet




Kelt: Kaposvár, 2017. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	15 000 000
Projekt teljes költsége	15 000 000

Kapoly Község Önkormányzata
 Kedvezményezett




Kelt: Kapoly, 2017. év 10. hónap 20. napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év 10. hónap 25. napján.



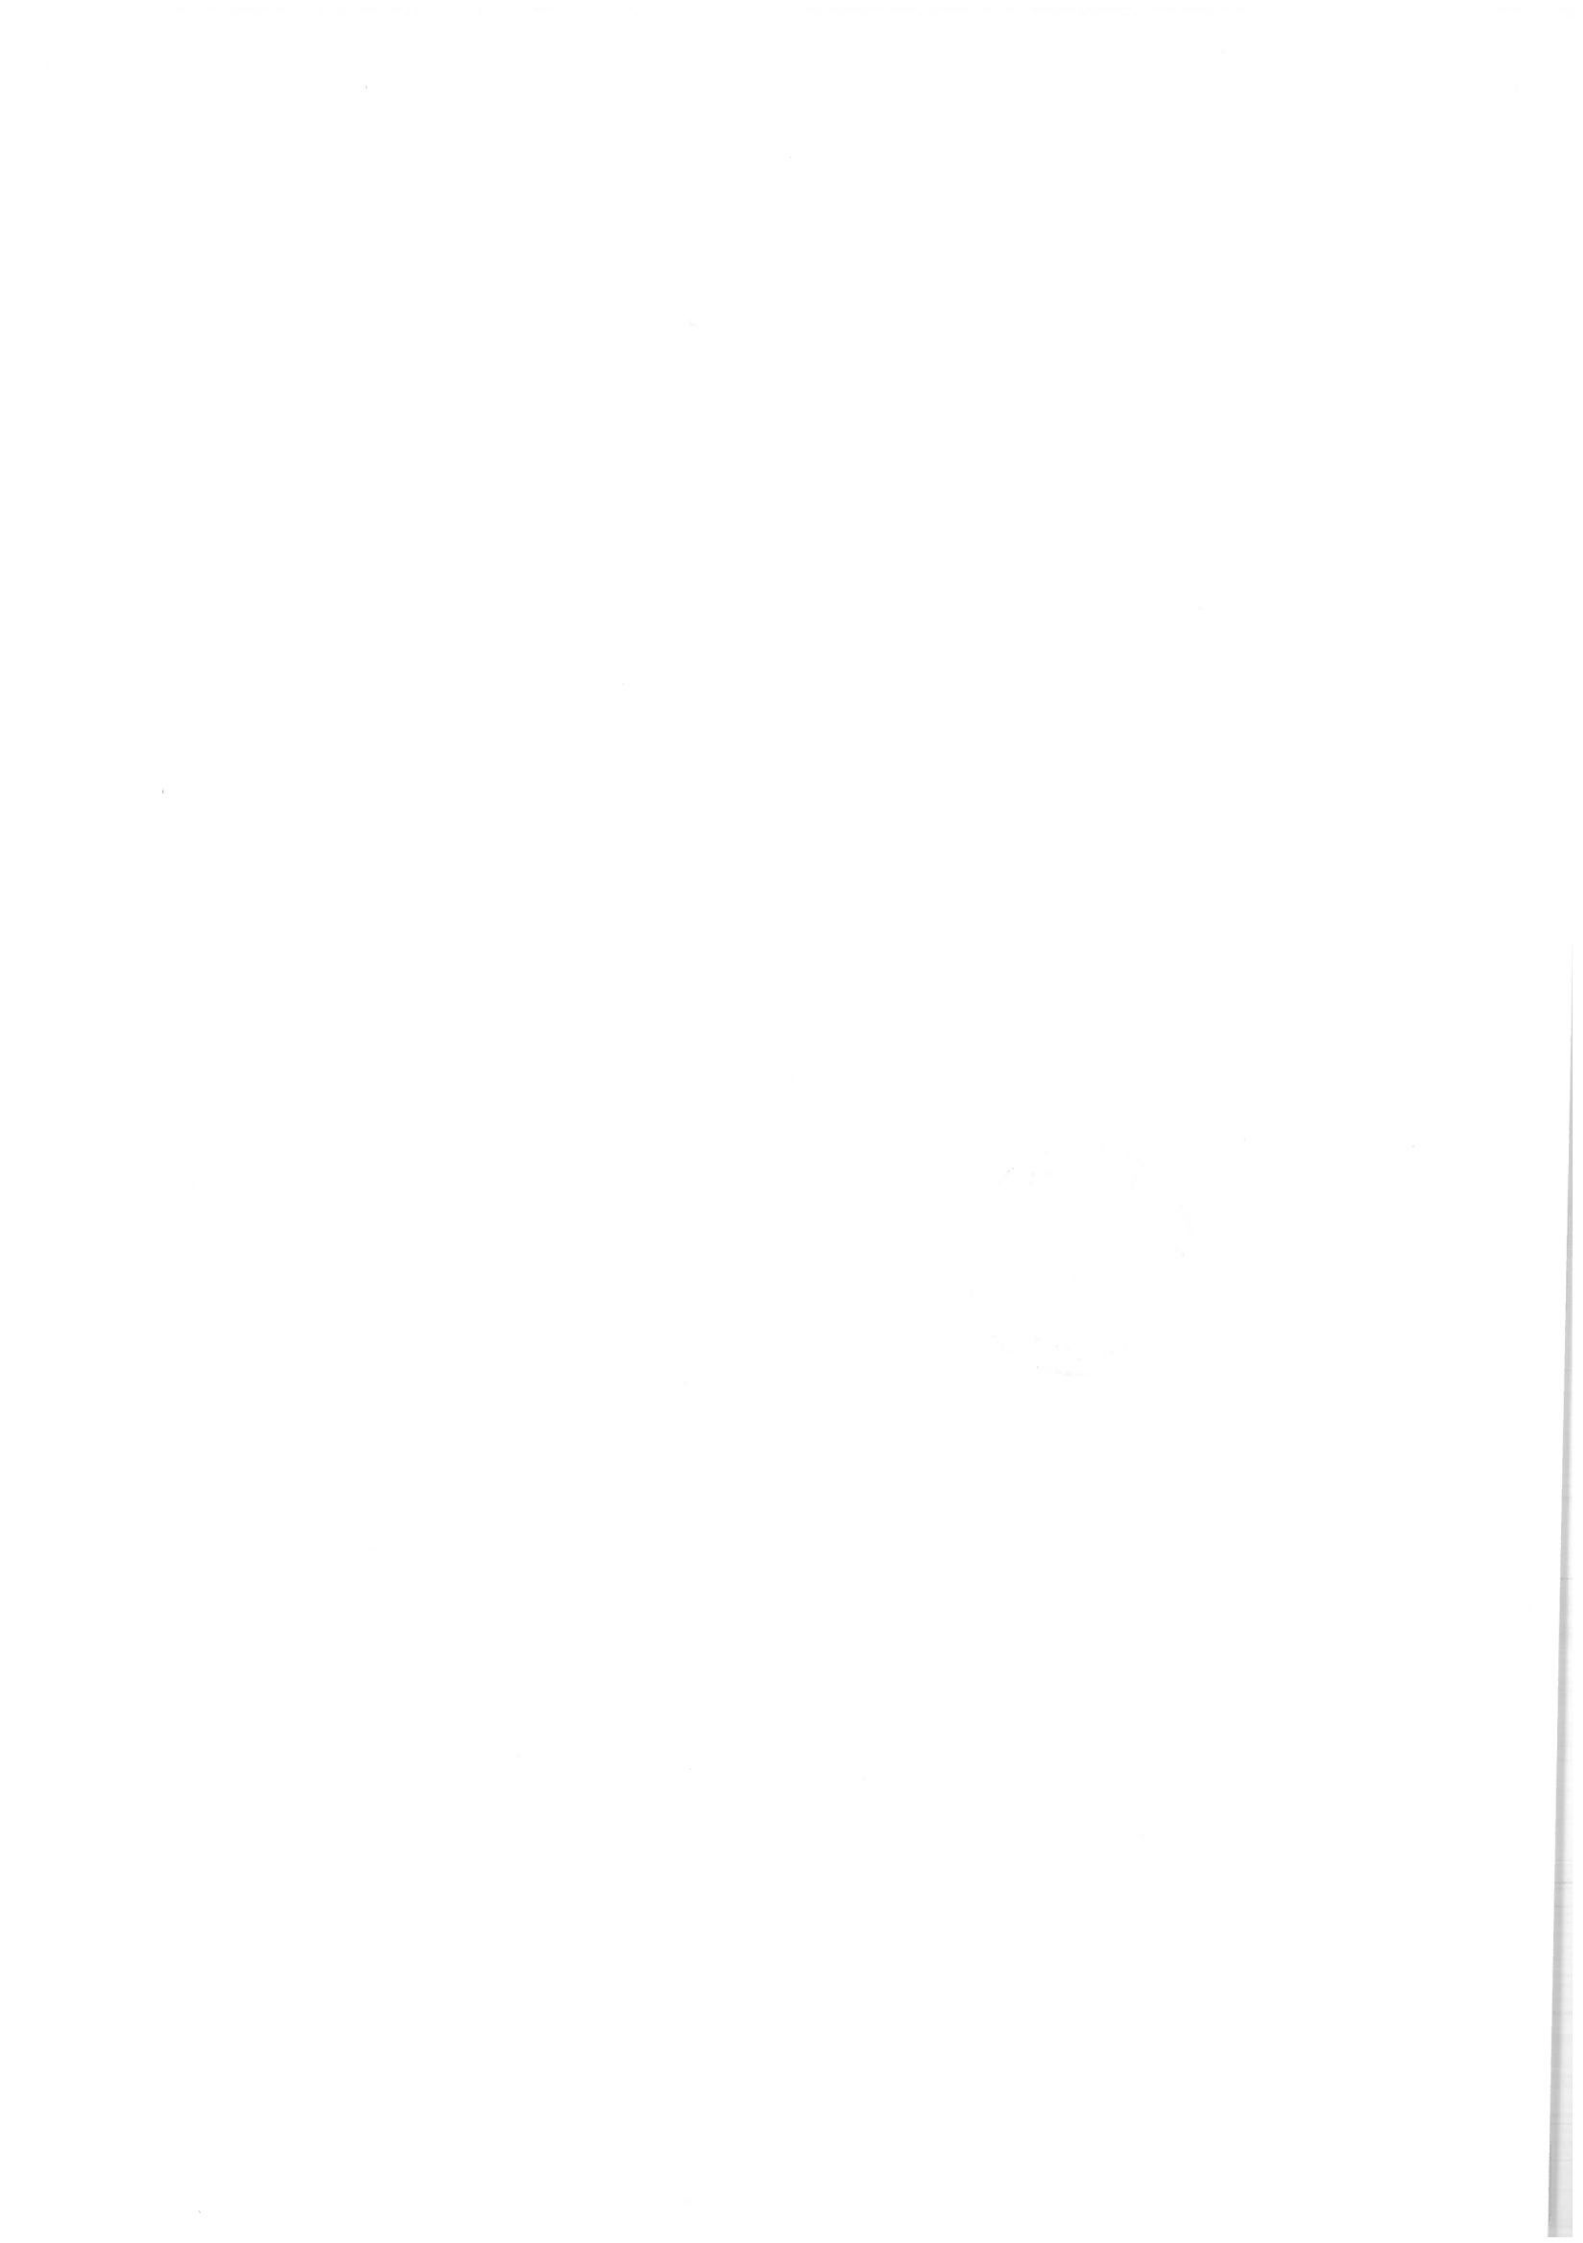

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
1	2017.11.30.	<p>A projekt első mérföldköve során, az előkészítés keretében teljes körűen elkészülnek a projekt előkészítési dokumentációi, teljesülnek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárások, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Elkészülnek az alábbi dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Műszaki tervdokumentáció. - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés. - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján. - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről. - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről. - Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről. - A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. <p>Megtörténik a költségvetés felülvizsgálata a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben szükséges, átcsoportosításra kerül sor.</p>
2	2018.01.30.	<p>A projekt kivitelezése - kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés készítése. Megindul a projektmenedzsment. Elkészülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. Véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás.</p>
3	2018.04.30.	<p>Beszerezés lefolytatása. - A kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása, a kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. A projekt során nem kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>
4	2018.08.30.	<p>A projekt kivitelezése - 50%-os készültségi szint elérése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>
5	2018.11.20.	<p>A projekt kivitelezése - 100%-os készültségi szint elérése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>

gy my a

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
6	2018.11.30.	Projektzárás: benyújtásra kerülnek: a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció, a teljesítés igazolások, záró kifizetési igénylés és egyéb projektzárást igazoló dokumentumok elkészítése. Projektmenedzsment tevékenység Megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása


Kapoly Község Önkormányzata
 Kedvezményezett


 P.H.

Kelt: **Kapoly**, 2017. év ...10... hónap ...20... napján.


Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet

 P.H.

Kelt: **Kaposvár**, 2017. év ...10... hónap ...25... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Felújított óvoda épület és kerítés	5	nyílászárók cseréje melegítő konyha felújítása tetőfelújítás külső tatarozás és hőszigetelés projektarányos akadálymentesítés utcafronti kerítés teljes felújítása drótkerítés cseréje	1	épület	Megvalósul a gazdasági épület héjazatának cseréje, utcafronti kerítés felújításának teljes hossza 33m
Felújított udvar	5	Az udvaron új burkolat készítése gumitéglából	56	m2	A célcsoport számára esős időszakban is használhatóvá válik az óvoda udvara.


 Kapoly Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



 Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kapoly, 2017. év 10. hónap 10. napján.

Kelt: Kaposvár, 2017. év 10. hónap 10. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2018.11.30.	22	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2019.11.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2020.11.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2021.11.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2022.11.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2023.11.30.	0	22	22

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet

Kelt: Kapoly, 2017. év 10. hónap 10. napján.


Kelt: Kaposvár, 2017. év 10. hónap 10. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050**
Kedvezményezett: **Kapoly Község Önkormányzata**

Kapoly Község Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

A Somogy Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.


Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: **Kapoly**, 2017. év ...10..... hónap ...20...
napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár**, 2017. év ...10..... hónap ...25...
napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Kapoly Község Önkormányzata és a **Somogy Megyei Önkormányzat** által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívására **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.09.07-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **"Óvoda fejlesztése Kapoly községben"** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kapoly Község Önkormányzata
Postacím:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Székhely:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 399959
Adószám:	15399959-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Vidus Lajos, polgármester dr. Mezőfi Ágnes, jegyző
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10403916-49555654-53511183

Szervezet neve:	Somogy Megyei Önkormányzat
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Biró Norbert, közgyűlés elnöke dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10039007-00313955-00000048

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016.09.21**-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Kapoly Község Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

Handwritten signatures and initials:
Cj, 7, My, huc k., Q

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.


A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átveszi a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Kapoly Község Önkormányzata	Projektelőkészítés	750.000,- Ft	750.000,- Ft
2.		Beruházáshoz kapcsolódó költségek	13.650.000,- Ft	13.650.000,- Ft
3.	Somogy Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	225.000,- Ft	225.000,- Ft
4.		Projektmenedzsment költség	375.000,- Ft	375.000,- Ft
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	KapolyKözség Önkormányzata	14.400.000,- Ft	14.400.000,- Ft	14.400.000,- Ft (100%)
2.	Somogy Megyei Önkormányzat	600.000,- Ft	600.000,- Ft	600.000,- Ft (100%)
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft (100%)

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	KapolyKözség Önkormányzata	nem releváns	0 Ft	0 %
2.	Somogy Megyei Önkormányzat	nem releváns	0 Ft	0 %
Mindösszesen:			0 Ft	0 %

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A támogatási szerződés keretében létrehozott vagyon tulajdonjoga, a szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző konzorciumi tagot illeti meg, a támogatási szerződés 1. számú mellékletében bemutatott tevékenységek szerinti megosztás alapján. A beszerzésre kerülő tárgyi eszközök az adott tag könyveiben, számviteli nyilvántartásaiban kerülnek kimutatásra.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -,

kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűzési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai

Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és munkafolyamatok eljárásrendjét és felelősségi rendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás **8 oldalon és 4 db eredeti példányban** készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Kaposvári Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Vidus Lajos

Vidus Lajos

dr. Mezőfi Ágnes



Aláírás dátuma:

2017.10.20.



Bíró Norbert


Dr. Sárhegyi Judit

Somogy Megyei
Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

2017.10.24.

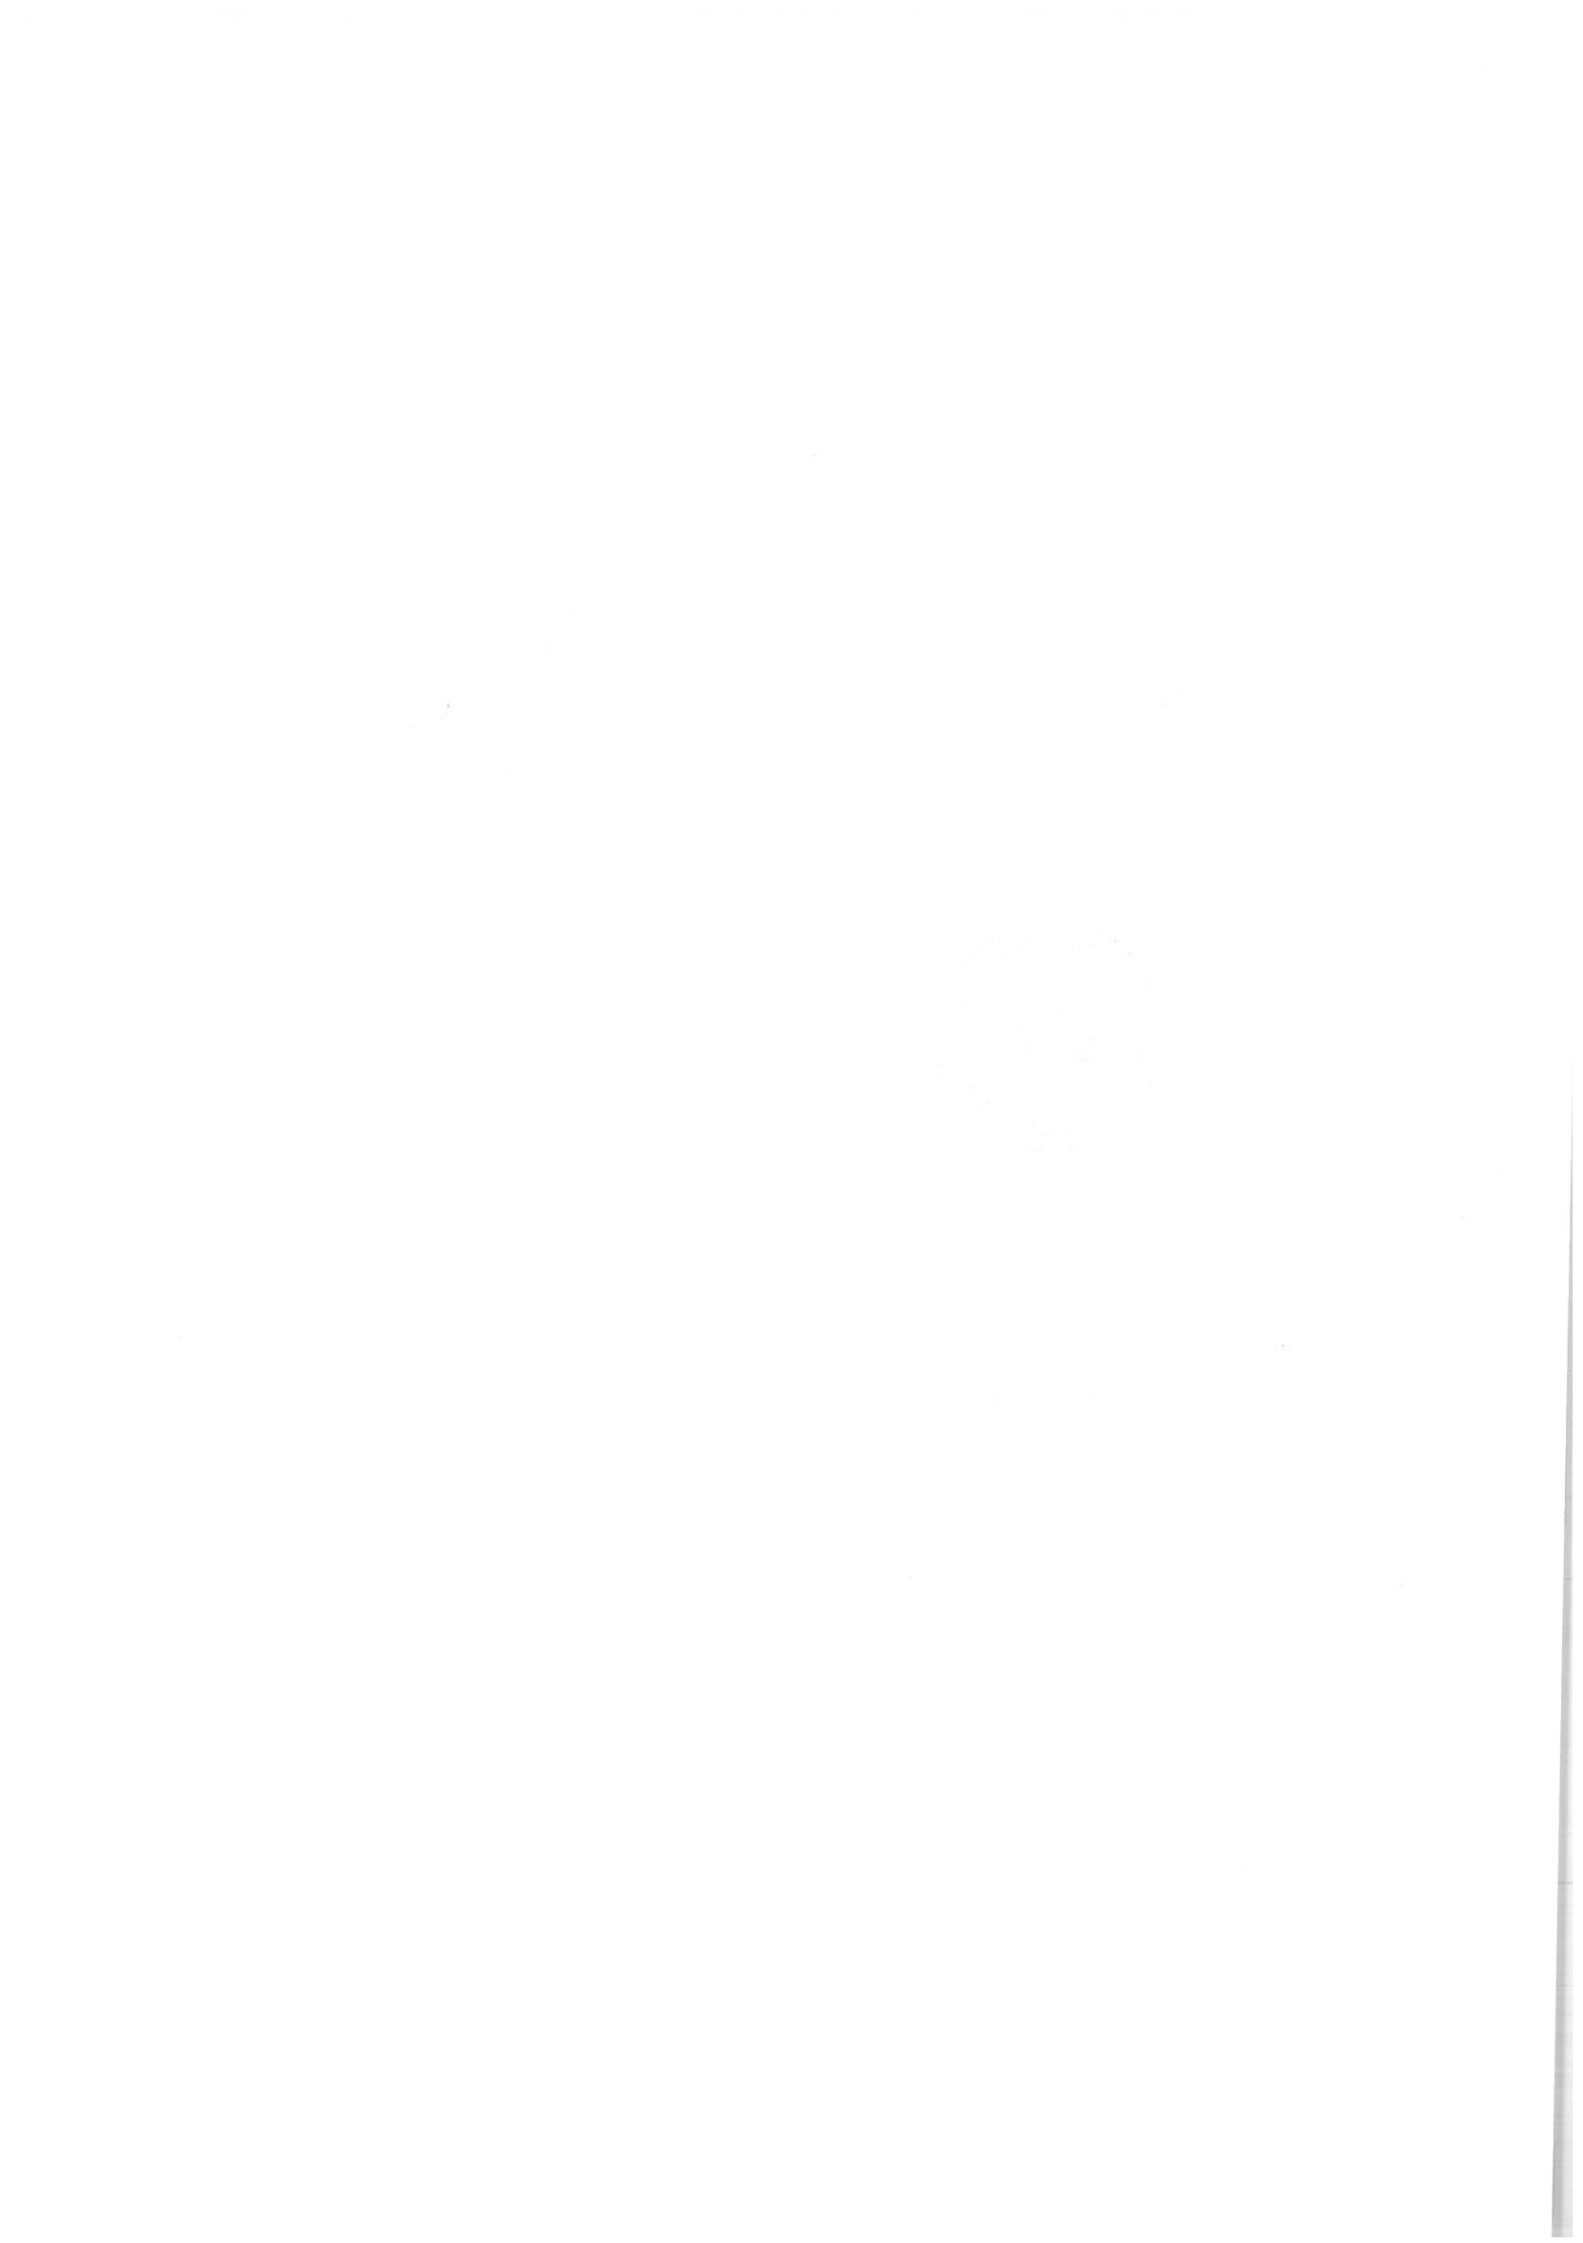

Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050

Ikt.: IKT-2018-614-11-0000 4498

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.115.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Kapoly Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56.

Székhely: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56.

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 399959

Adószám: 15399959-1-14

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10403916-49555654-53511183

Aláírásra jogosult képviselője: Vidus Lajos, polgármester
dr. Mezőfi Ágnes, jegyző

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.10.25. napján a „**Óvoda fejlesztése Kapoly községben**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti **Támogatási Szerződés** törzsszövege változatlan marad, az 1. számú „A projekt költségvetése” melléklete változik, helyébe a jelen módosításhoz csatolt 1. számú melléklet lép.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Az eredeti Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad, a 3. számú „A projekt mérföldkövei” melléklete változik, helyébe a jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad, a 7. számú „Konzorciumi együttműködési megállapodás” melléklete változik, helyébe a jelen módosításhoz csatolt 7. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés **2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban** készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: **Kapoly, 2018.** év hónap **08**
napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: **Kaposvár, 2018.** év hónap **16**
napján.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet – A projekt költségvetése
- 3.sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 7.sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	10 748 032	2 901 968	13 650 000
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	472 441	127 559	600 000
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletelemzés, előzetes igényfelmérés	1	118 110	31 890	150 000
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	313 582	0	313 582
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	61 418	0	61 418
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	59 055	15 945	75 000



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	118 110	31 890	150 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							15 000 000

Vass György
Kapoly Község Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P.H.

Kelt: Kapoly, 2018. év hónap napján.

M. A. P. H.
Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kaposvár, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050**
 Kedvezményezett: **Kapoly Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
1	2018.04.30.	<p>A projekt első mérföldköve során, az előkészítés keretében teljes körűen elkészülnek a projekt előkészítési dokumentációi, teljesülnek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárások, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Elkészülnek az alábbi dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Műszaki tervdokumentáció. - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés. - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján. - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről. - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről. - Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről. - A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. <p>Megtörténik a költségvetés felülvizsgálata a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben szükséges, átcsoportosításra kerül sor.</p> <p>Megindul a projektmenedzsment.</p>
2	2018.05.31.	<p>A projekt kivitelezése - kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés készítése. Elkészülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. Véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás.</p>
3	2018.06.30.	<p>Beszerezés lefolytatása. - A kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása, a kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. A projekt során nem kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>
4	2018.08.30.	<p>A projekt kivitelezése - 50%-os készültségi szint elérése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>
5	2018.11.20.	<p>A projekt kivitelezése - 100%-os készültségi szint elérése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>



Handwritten signature and initials in blue ink.




Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
6	2018.11.30.	Projektzárás: benyújtásra kerülnek: a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció, a teljesítés igazolások, záró kifizetési igénylés és egyéb projektzárást igazoló dokumentumok elkészítése. Projektmenedzsment tevékenység Megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása


Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kapoly, 2018. év hónap napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2018. év hónap napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Amely létrejött a Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kapoly Község Önkormányzata
Postacím:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Székhely:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 399959
Adószám:	15399959-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Vidus Lajos, polgármester dr. Mezőfi Ágnes, jegyző
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10403916-49555654-53511183

Szervezet neve:	Somogy Megyei Önkormányzat
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Biró Norbert, közgyűlés elnöke dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10039007-00313955-00000048

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Kapoly Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat 2017.10.24-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek támogatásban részesített projekt megvalósítására, a **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050** azonosító számon regisztrált, „Óvoda fejlesztése Kapoly községben” című projekt megvalósítására.

A Tagok a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alábbi pontjait módosítják

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

Q kap. c. y. y

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Kapoly Község Önkormányzata	Projektelőkészítés	750.000,- Ft	750.000,- Ft
2.		Beruházáshoz kapcsolódó költségek	13.650.000,- Ft	13.650.000,- Ft
3.		Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	225.000,- Ft	225.000,- Ft
4.	Somogy Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	375.000,- Ft	375.000,- Ft
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Kapoly Község Önkormányzata	14.625.000,- Ft	14.625.000,- Ft	14.625.000,- Ft (100%)
2.	Somogy Megyei Önkormányzat	375.000,- Ft	375.000,- Ft	375.000,- Ft (100%)
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft (100%)

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

	Tag neve	Tevékenység
1.	Kapoly Község Önkormányzata	Projektelőkészítés
2.		Beruházáshoz kapcsolódó költségek
3.		Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
4.	Somogy Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment költség

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.


Jelen Megállapodás módosítás 3 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás módosítás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

u u
 u u
 R

A Tagok a Megállapodás módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag



Vidus Lajos

Biró Norbert

dr. Mezőfi Ágnes

Dr. Sárhegyi Judit

Kapoly Község
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2018.05.08.

Somogy Megyei
Önkormányzat



Aláírás dátuma:

2018.05.10.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BÉFEKTETÉS A JÓVÓBA



Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050

Ikt.: IKT - 2016 - 614 - 11 - 00001528 / 0013

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselétében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.115.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Tapsonyi Tünde, igazgató;
 Skodáné Szauervein Zsuzsanna, irodavezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Kapoly Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
 Székhely: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 399959
 Adószám: 15399959-1-14
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10403916-49555654-53511183
 Aláírásra jogosult képviselője: Vidus Lajos, polgármester
 dr. Hajas Endre, jegyző

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.10.25. napján a „Óvoda fejlesztése Kapoly községben” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet 2018.05.16. napon mérföldkövek és költségvetés változásának tárgyában módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.1. pontjába az alábbi szöveg lép, a törzsszöveg többi pontja változatlan marad.

eredeti szöveg:

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 11. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 02. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

módosított szöveg

3.3.A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 1. számú „A Projekt költségvetése” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 1. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3. számú „Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4. számú „A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 5. számú „Projekt indikátorai” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 7. számú „Konzorciumi együttműködési megállapodás” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 7. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 9. számú „Rövid összefoglalás a projektről” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 9. számú melléklet lép.


III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés **3 (három) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban** készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: **Kapoly, 2019.** év 11 hónap 20 napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: **Kaposvár, 2019.** év 11 hónap 25 napján.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet – A projekt költségvetése
- 3.sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai
- 7.sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
9. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről

4



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	8 825 933	2 383 002	11 408 935
KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	90 000	0	90 000
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	312 582	0	312 582
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	61 418	0	61 418
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	16 206	4 375	20 581
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Eszközbeszerzés költsége	Bekerülési érték	1	2 879 136	426 348	3 105 484
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							15 000 000

9

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kapoly, 2019. év ... 11. hónap napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2019. év ... 11. hónap ... 25. napján.

4

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
1	2018.04.30.	Nem teljesült.
2	2018.05.31.	Nem teljesült.
3	2018.06.30.	Nem teljesült.
4	2018.08.30.	Nem teljesült.
5	2018.11.20.	Nem teljesült.
6	2020.05.30.	<p>Az előkészítés keretében teljes körűen elkészülnek a projekt előkészítési dokumentációi, teljesülnek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárások, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Elkészülnek az alábbi dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none">- Műszaki tervdokumentáció.- Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés.- Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján.- Akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről.- Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről.- Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről.- A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. <p>Megtörténik a költségvetés felülvizsgálata a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben szükséges, átcsoportosításra kerül sor.</p> <p>Megindul a projektmenedzsment. A projekt kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés készítése. Elkészülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. A projekt kivitelezése - 50%-os készültségi szint elérése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p> <p>Beszerezés lefolytatása. - A kivitelezésre vonatkozó szerzési eljárások lefolytatása, a kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése.</p> <p>Véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás</p>
7	2020.08.31.	<p>A projekt kivitelezése - 100%-os készültségi szint elérése</p> <p>Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció és a teljesítés igazolások.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység</p>

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
8	2020.09.30.	Projektzárás: benyújtásra kerülnek: a műszaki ellenőr beszámolója, a fotódokumentáció, a teljesítés igazolások, záró kifizetési igénylés és egyéb projektzárást igazoló dokumentumok elkészítése. Projektmenedzsment tevékenység Megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kapoly, 2019. év 11. hónap 25. napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kaposvár, 2019. év 11. hónap 25. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050
 Kedvezményezett: Kapoly Község Önkormányzata

Eredmény megnevezése:	Mérőföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékessége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Felújított óvoda épület és kerítés	8	Tetőfelújítás kerítés utcafronti kerítés felújítása	1	épület	Megvalósul a tető és az utcafronti kerítés felújítása
Felújított udvar	8	Az udvaron új burkolat készítése gumitéglából	56	m2	A célcsoport számára esős időszakban is használhatóvá válik az óvoda udvara.

Kapoly Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Kapoly, 2019. év 11. hónap 20. napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet

P.H.



Kelt: Kaposvár, 2019. év 11. hónap 25. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050**
Kedvezményezett: **Kapoly Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2020.09.30.	22	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2021.09.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2022.09.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2023.09.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2024.09.30.	0	22	22
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (Darab)	-	0	2025.09.30.	0	22	22

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
8671 Kapoly, Községi Hivatal

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet
P.H.
8671 Kapoly, Községi Hivatal

Kelt: **Kapoly, 2019. év** hónap napján.

Kelt: **Kaposvár, 2019. év** hónap napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050**
Kedvezményezett: **Kapoly Község Önkormányzata**

A projekt általános célja Kapoly községben az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a komfortosabb szolgáltatási környezet megteremtése érdekében, számos új eszköz kerül beszerzésre, amely a kisgyermek magasabb szintű ellátását és nevelését segíti.

Jelenleg az intézmény nem rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű játékkal, ezért rendkívül fontos a kinti és benti játékok számát növeljük, illetve újabb, gyerekeket fejlesztő játékokat szerezzünk be. A nevelőmunkában kiemelkedő figyelmet kell fordítani az érzelmi nevelésre, a jó közösségek kialakítására, a saját és közösség érdekében végzett tevékenykedésre. Mindezek tudatában a külső és belső környezetet úgy kell kialakítani, hogy az családias, érzelmet sugárzó legyen. A probléma csökkentésére új eszközök és játékok, bútorok javasoltak, hiszen a modern eszközökkel meg tudják teremteni a szükséges idillt. Az óvoda eszközeinek állapota elhasználódott, melynek eredményeként a mai kor elvárásainak megfelelő feltételek nem biztosítottak. Mivel sem a kültéri, sem a beltéri játszóeszközök nem alkalmasak arra, hogy a gyermekek igényeit kielégítsék, így szükségessé vált azok korszerűsítése.

A projekt során sor kerül az óvoda udvarának fejlesztésére, mely megújult formájában - gumitéglá borítással - biztonságosabb és az udvari játékok telepítésével a gyermekek számára sokkal szórakoztatóbbá válik. A pályázat során több olyan eszköz kerül beszerzésre, amely a gyermekek mindennapi ellátásához nélkülözhetetlen, a hozzásegíti az óvodát ahhoz, hogy a gyermekeket higiénikusabb környezetben nevelhessük. A beszerezni kívánt játékokkal a kicsik mindennapjait kívánjuk színesebbé tenni.

A tervezett tetőfelújítás elengedhetetlen az óvoda megfelelő működéséhez, hiszen a tető nagyon rossz állapotban van. A beruházás során megvalósítani kívánt kerítés felújítás szintén hozzájárul az óvoda rendezett képének kialakításához, továbbá a gyermekek biztonságát is szolgálja.

Kapoly Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kapoly, 2019. év hónap napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2. számú módosítása

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Amely létrejött a Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kapoly Község Önkormányzata
Postacím:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Székhely:	8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 399959
Adószám:	15399959-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Vidus Lajos, polgármester dr. Hajas Endre, jegyző
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10403916-49555654-53511183

Szervezet neve:	Somogy Megyei Önkormányzat
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Biró Norbert, közgyűlés elnöke dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10039007-00313955-00000048

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Kapoly Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat 2017.10.24-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek támogatásban részesített projekt megvalósítására, a **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00050** azonosító számon regisztrált, „**Óvoda fejlesztése Kapoly községben**” című projekt megvalósítására.

A Tagok a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alábbi pontjait módosítják

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

R *ly* *cy*
Pir N.

2

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Kapoly Község Önkormányzata	Projektelőkészítés	90.000,- Ft	90.000,- Ft
2.		Beruházáshoz kapcsolódó költségek	14.514.419,- Ft	14.514.419,- Ft
3.		Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	20.581,- Ft	20.581,- Ft
4.	Somogy Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	375.000,- Ft	375.000,- Ft
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Kapoly Község Önkormányzata	14.625.000,- Ft	14.625.000,- Ft	14.625.000,- Ft (100%)
2.	Somogy Megyei Önkormányzat	375.000,- Ft	375.000,- Ft	375.000,- Ft (100%)
Mindösszesen:			15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft (100%)

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

	Tag neve	Tevékenység
1.	Kapoly Község Önkormányzata	Projektelőkészítés
2.		Beruházáshoz kapcsolódó költségek
3.		Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
4.	Somogy Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment költség

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Jelen Megállapodás módosítás 3 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás módosítás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark.

A Tagok a Megállapodás módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Vidus Lajos *Biró Norbert*

Vidus Lajos

Biró Norbert

dr. Hajas Endre

Dr. Sárhegyi Judit

Kapoly Község
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

*2019. 11. 20.**2019. 11. 20.*



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
